


2014年 2月 25日 本庁舎のとりこわし

本庁舎のとりこわし工事が始まります。

2月17日（月）から敷地外周の仮囲い（3m）を設置しています。

内部設備等の撤去を行い、3月17日（月）より建物の解体に着手する予定です。

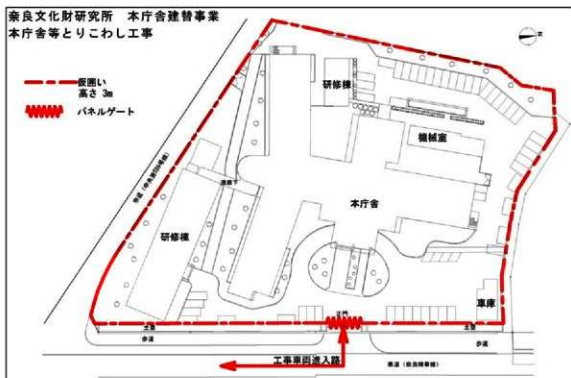

本庁舎（H26.2.25 撮影）

2014年 3月 1日 本庁舎のとりこわし開始

本庁舎のとりこわし工事

3月17日（月）から建物本体（躯体）の取り壊しを開始します。

図の斜線部の取り壊しから実施します。

解体に伴い騒音等が発生します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。



本庁舎（H26.3.14 撮影）

2014年 4月 20日 本庁舎 躯体 のとりこわし

本庁舎のとりこわし工事

4月14日(月)から図の青色斜線部分の建物本体(躯体)の取り壊しを行っています。

解体に伴い騒音等が発生します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。



本庁舎 (H26. 4. 18 撮影)

2014年 5月 9日 本庁舎のとりこわし

本庁舎のとりこわし工事

5月8日（木）から図の青色斜線部分の建物本体（躯体）の取り壊しを行っています。

解体に伴い騒音等が発生します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。



本庁舎（H26.5.9 撮影）


2014年 5月 26日 本庁舎のとりこわし

本庁舎のとりこわし工事

5月24日（土）地上部分の建物本体（躯体）の取り壊しがほぼ完了し、5月26日（月）からは、地中部分の基礎等の解体を行っています。

地中部分の解体は、埋蔵文化財の調査と連携しながら実施しています。

解体に伴い、騒音等が発生します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。

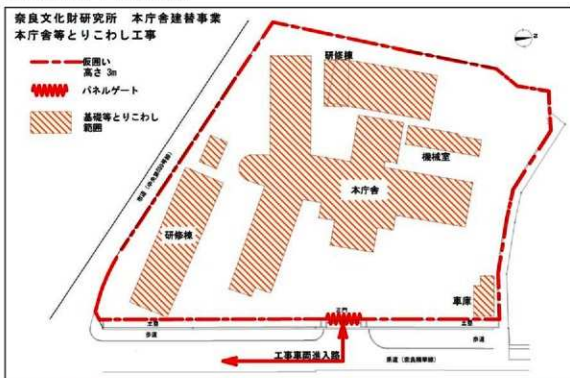


本庁舎（H26.5.26 撮影）

2014年 11月 11日 本庁舎のとりこわし

本庁舎のとりこわし工事

建物地上部分の解体工事を進めてきました。地上部分は5月24日に解体を終えています。その後、発掘調査の進捗に合わせて、建物周辺の舗装や建物に付帯していた地中構造物等を順次解体撤去しています。

この後、発掘調査の終了後に、基礎杭の引き抜き作業及び外周柵等の解体を進める予定です。

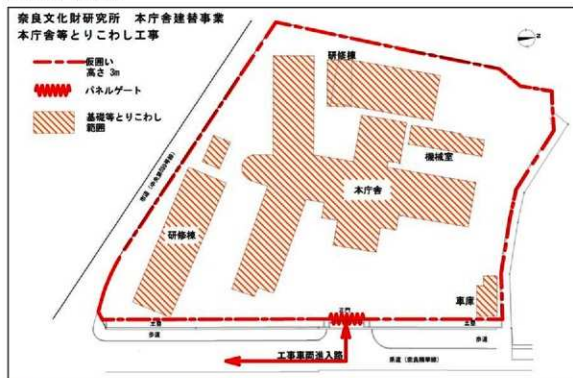


解体作業状況（アスファルト舗装撤去）

2015年 4月 28日 本庁舎のとりこわし

本庁舎のとりこわし工事

基礎杭の引き抜き作業、外周花壇及び構内道路舗装の解体を4月28日に終わりました。

順次、とりこわしによる発生材の搬出及び整地作業をすすめ、とりこわし工事は、5月1日に完了します。

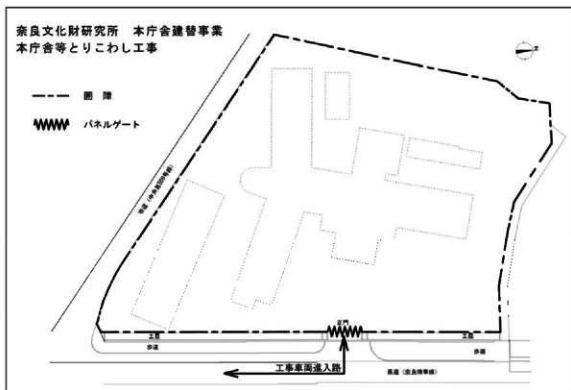


敷地状況（H27. 4. 27 撮影）

2015年 5月 29日 本庁舎のとりこわし

本庁舎のとりこわし工事

とりこわし工事については、5月29日に全ての工事及び検査が終了しました。工事期間中、近隣の皆様には騒音等で大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

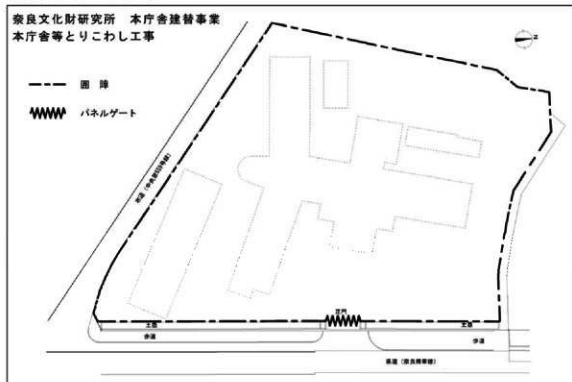

敷地状況（H27. 5. 28 撮影）
